TENAZ

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Roadmap — Tenaz

Tenaz · Gestão de Manutenção e Frota

Arquivo: 6_ROADMAP.md

Versão: 0.3 · **Data:** 12/11/2026 · **Status:** Em elaboração **Produto:** Tenaz · Gestão de Manutenção e Frota
Alinhado ao sumário executivo 0.4.

Este documento organiza a entrega das três fases definidas no sumário executivo (seção 4): MVP (meses 0 a 6), Fase 2 (meses 6 a 12) e Fase 3 (meses 12 a 24). O MVP está quebrado em sprints de 2 semanas; as Fases 2 e 3, em blocos mensais. Cada bloco lista os requisitos que entrega, com os IDs de 1_ESPECIFICACAO_REQUISITOS.md (versão 0.3).

A sequência, a duração dos blocos, a equipe e as datas são **proposta**, salvo onde o texto indica a fonte. Nenhuma estimativa vem de velocidade medida: o time ainda não existe.

Mudanças da versão 0.1: o sumário 0.3 acrescentou o TER básico ao MVP e o TER completo, o EST estendido e a LOC à Fase 2, e moveu a assinatura avançada, os webhooks e a reserva de estoque para o MVP. O MVP passou de 99 para 105 requisitos funcionais e a Fase 2 de 43 para 62. Para manter os prazos do sumário, o time cresce: o terceiro backend é antecipado para o início do MVP (12 pessoas) e a Fase 2 ganha uma quarta trilha (15 pessoas). Entrou também o RNF-039 (controle de versão e versão visível na interface).


Mudanças da versão 0.2: o sumário 0.4 colocou no MVP o módulo **SRV** completo (conta própria da subcontratada, técnicos, clientes, equipamentos de clientes, OS de serviço, componentes, app do técnico, relatório em PDF e conexão com clientes Tenaz). O MVP passa de 105 para **126** requisitos funcionais e os não funcionais de 40 para **42** (RNF-041 e RNF-042, risco R5). O reaproveitamento de OS, apontamento, ativos e app reduz o esforço, mas o acréscimo (cerca de 16 sprints-pessoa de desenvolvimento, seção 2.1) não cabe no time de 12 pessoas em 13 sprints. **Proposta:** antecipar para S1 o quarto backend e o terceiro frontend que já estavam previstos para a Fase 2 (MVP com **14 pessoas**, Fase 2 continua com 15), manter as **13 sprints** e o lançamento na semana 26, abrir uma **trilha SRV** paralela a partir de S1 e liberar a conexão entre contas só com o teste de três contas de RNF-041 verde (riscos R5 e R6 do sumário). Também foram aplicadas as decisões de nomes do sumário 3.6 (por exemplo, `os.encerrar` e o link de uso único com token no fragmento da URL).

Índice

1. Visão geral
2. Premissa de equipe
3. Critério de pronto
4. MVP — meses 0 a 6
5. Fase 2 — meses 7 a 12
6. Fase 3 — meses 13 a 24
7. Atividades não técnicas
8. Dependências críticas
9. Riscos do cronograma

---

1. Visão geral

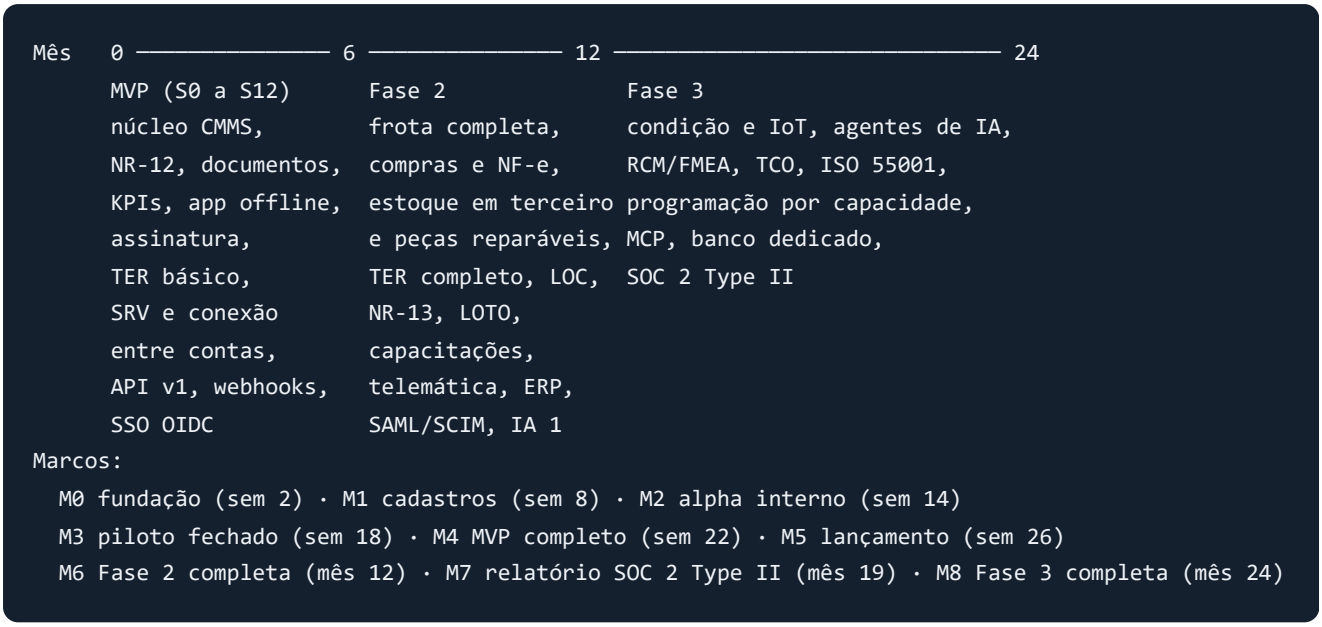

Fase	Período	Requisitos funcionais	Fonte do escopo
MVP	Meses 0 a 6 (13 sprints)	126 (105 + 21 do SRV)	Sumário, seção 4
Fase 2	Meses 7 a 12	62	Sumário, seção 4
Fase 3	Meses 13 a 24	16	Sumário, seção 4

Requisitos não funcionais: 42 (RNF-001 a RNF-042), verificados nos marcos da seção 3.2. RNF-041 e RNF-042 (conexão entre contas) valem desde o MVP.

O mês 0 começa quando o núcleo do time (seção 2) estiver contratado. As datas de calendário serão fixadas nesse momento (proposta).

2. Premissa de equipe

Os prazos deste roadmap só valem com o time abaixo. É um time enxuto para o escopo: 14 pessoas em tempo integral no MVP e 15 a partir da Fase 2 (proposta). Em relação à versão 0.2, o quarto backend e o terceiro frontend, que entrariam na Fase 2, são antecipados para S1 por causa do SRV (seção 2.1); o time da Fase 2 não muda.

Papel	MVP	Fase 2	Fase 3	Responsabilidade principal
Gerente de produto	1	1	1	Prioridades, entrevistas (P4), pilotos, aceite
Designer de produto	1	1	1	Fluxos, design system, testes com usuários (RNF-028), fluxos da subcontratada (SRV)
Líder técnico (Go)	1	1	1	Arquitetura, revisão, RLS, decisões técnicas, ADR-009 (conexão entre contas)

Papel	MVP	Fase 2	Fase 3	Responsabilidade principal
Backend Go	4	4	4	Domínio, API, rotinas, integrações, isolamento do prestador e do locatário; no MVP, um backend dedicado à trilha SRV e à sincronização entre contas
Frontend React/TypeScript	3	3	3	Web de gestão, painéis, portal de solicitação, página do link de execução, portal do locatário; no MVP, um frontend dedicado às telas do SRV e da conexão
Mobile React Native (Expo)	2	2	2	App offline, sincronização, câmera, QR, perfil prestador, técnico da subcontratada, assinatura do cliente, vistorias
QA com automação	1	1	1	Testes de ponta a ponta, offline, isolamento entre empresas, prestadores, locatários e contas conectadas (RNF-041)
Plataforma/SRE	1	1	1	Infra em São Paulo, CI/CD, esteira de versionamento (RNF-039), backup, observabilidade (inclusive atraso da sincronização entre contas, RNF-042), SOC 2
Engenharia de dados e IA	0	1	1	Telemática, RAG, IoT, KPIs avançados
Total em tempo integral	**14**	**15**	**15**	

Apoio externo em tempo parcial (proposta): advogado (P1, P7, contratos, LGPD); consultor de SST para validar NR-12, NR-13 e LOTO; contador para NF-e, CBS e IBS e para os CFOPs de remessa, conserto e locação (P8); empresa de pentest; auditor SOC 2; encarregado de dados como serviço.

2.1 O MVP cabe em 13 sprints?

Com o SRV no MVP, não cabe no time de 12 pessoas da versão 0.2. Cabe em 13 sprints com 14 pessoas (quarto backend e terceiro frontend antecipados para S1), com folga pequena e linha de corte revista (proposta, sem velocidade medida). Nas estimativas abaixo, "sprint" é o trabalho de uma pessoa durante uma sprint de 2 semanas.

Acréscimo do SRV (sumário 0.4)

O SRV reaproveita a OS (estados, marcos, execução, assinatura, impressão), o apontamento, o cadastro de ativos e medidores, o catálogo de serviços do TER, o estoque básico e o app offline. O que é novo é o lado da subcontratada (cliente atendido, equipamento `de_cliente`, especialidades, serviço a realizar, componentes, distribuição, assinatura do cliente, relatório) e, principalmente, a **conexão entre contas**, que não tem paralelo no restante do produto.

Bloco	Requisitos	Reaproveita	Backend	Frontend	Mobile
Conta e plano Serviços	RF-SRV-001	RF-ADM-001, RF-ADM-009	0,5	0,5	—
Técnicos, especialidades e clientes	RF-SRV-002 a RF-SRV-004	RF-ADM-004, RF-ADM-015, RF-CON-005; padrão do cadastro de locatário	1	1	—

Bloco	Requisitos	Reaproveita	Backend	Frontend	Mobile
Equipamentos de clientes	RF-SRV-005	Todo o ATV e o MED (só a propriedade `de_cliente` e o vínculo com o cliente são novos)	0,5	0,5	0,25
Catálogo, OS de serviço, componentes e horas	RF-SRV-006 a RF-SRV-009	RF-TER-002, RF-OS-001 a RF-OS-010	1,5	1	0,75
Distribuição, app do técnico e assinatura do cliente	RF-SRV-010 a RF-SRV-012	RF-OS-007, RF-OS-017, RF-MOB-001 a RF-MOB-006, RF-CON-014	0,5	0,5	1
Relatório em PDF, relatório por cliente e indicadores	RF-SRV-013, RF-SRV-020, RF-SRV-021	RF-OS-018, RF-IND-001, RF-IND-002, RF-IND-007	0,75	1	—
Conexão entre contas	RF-SRV-014 a RF-SRV-019, RNF-041, RNF-042	Outbox e idempotência do app (RF-MOB-002), auditoria	**3 a 4**	1	0,5
Total SRV	21 RF, 2 RNF		**cerca de 8 a 9**	**cerca de 5,5**	**cerca de 2,5**

Somam-se cerca de 1,5 a 2 sprints de QA (teste de três contas e cenários de sincronização), 1 a 1,5 de design (fluxos da subcontratada e da conexão) e 0,5 de plataforma (papel de banco e monitoração do atraso da sincronização). Sem o reaproveitamento, o mesmo escopo custaria cerca do dobro.

Efeito. O backend é o gargalo: 8 a 9 sprints divididas por 3 backends dariam cerca de 3 sprints a mais. Com o time de 12 pessoas, o MVP iria para **15 a 16 sprints** (lançamento entre as semanas 30 e 32), contra as 13 do sumário. Por isso a proposta é:

1. **Time:** antecipar para S1 o quarto backend (dono da trilha SRV e da sincronização entre contas, com o líder técnico no desenho do ADR-009) e o terceiro frontend (telas do SRV e da conexão). Os dois já estavam no plano da Fase 2; o custo adicional é de cerca de 6 meses de duas pessoas. O MVP fica com 14 pessoas; a Fase 2 continua com 15. O terceiro frontend, que conhece React, apoia as telas do app do técnico da subcontratada em React Native (proposta), aliviando o mobile.
2. **Prazo:** mantido em 13 sprints (S0 a S12), com lançamento na semana 26. A capacidade nova (cerca de 10 sprints de backend e 9 de frontend) cobre o SRV e devolve a folga de frontend que a versão 0.2 já não tinha.
3. **Linha de corte:** revista com três itens do SRV que podem ir para o início da Fase 2 sem tirar o valor principal (seção abaixo).
4. **Portão da conexão (R5):** a conexão entre contas (RF-SRV-014 a RF-SRV-019) só é liberada com o teste de três contas de RNF-041 verde e o atraso de RNF-042 medido em homologação. Se o portão não estiver verde no fim de S10 (M4), a conexão sai do lançamento e entra no mês 7, na trilha D, e o SRV é lançado no modo "sem cliente na Tenaz" (relatório da OS em PDF), o que exige aval do dono do produto, porque o sumário 4 põe a conexão no MVP.

Se o quarto backend e o terceiro frontend não forem contratados até S1, as alternativas são: (a) MVP em 15 a 16 sprints com 12 pessoas, lançamento entre as semanas 30 e 32; (b) só o quarto backend: MVP em 14 sprints (lançamento na semana 28), ou 13 sprints com a linha de corte aplicada até o item 10; (c) nenhum dos

dois e prazo fixo: 13 sprints com a conexão entre contas inteira (RF-SRV-014 a RF-SRV-019) no mês 7 da Fase 2, decisão que contraria o sumário 4 e precisa do dono do produto.

Acréscimo da versão 0.2 (sumário 0.3), já absorvido

O que o sumário 0.3 acrescentou ao MVP, em estimativa grosseira de esforço:

Mudança	Efeito no MVP	Esforço adicional estimado
TER básico (RF-TER-001 a RF-TER-005)	4 requisitos novos (RF-TER-001 substitui RF-EST-010); filtro por fornecedor no servidor e na sincronização; teste automatizado de isolamento do prestador (RNF-037, risco R4); página pública do link de uso único	1 a 1,5 sprint de backend; 0,5 sprint de frontend; pouco no mobile, que reaproveita o fluxo do técnico
Pessoa (RF-ADM-015)	Entidade nova que muda o cadastro de usuários, motoristas e documentos pessoais desde S1	0,5 sprint de backend
Assinatura avançada (RF-CON-014) no MVP	Antes só a base plugável estava em S8; agora entram reautenticação, hash, manifesto e PDF de evidências	0,5 sprint de backend
Reserva no MVP (RF-EST-006) e inventário na Fase 2 (RF-EST-005)	Troca de um requisito por outro de tamanho parecido	Neutro
Controle de versão (RNF-039)	Esteira em S0 e selo de versão na primeira tela	Menos de 0,5 sprint de plataforma e frontend

Total: cerca de 2 a 2,5 sprints de backend e 0,5 a 1 sprint de frontend a mais, num cronograma que já não tinha folga (risco 2). O terceiro backend, antecipado para S0 na versão 0.2, absorveu o acréscimo de backend; o frontend ficou sem folga em S7 a S10, o que o terceiro frontend antecipado nesta versão resolve.

Linha de corte

Se o time for menor que o da seção 2, o prazo cresce ou o escopo cai. Com 6 desenvolvedores em vez de 10 (por exemplo, líder técnico, 2 backend, 1 frontend e 2 mobile), estima-se de 11 a 12 meses para o escopo de 126 requisitos (proposta). Para manter 6 meses com time menor, a linha de corte abaixo sai do MVP e vai para o início da Fase 2, nesta ordem:

Ordem de corte	Requisito	Impacto de adiar
1	RF-OS-018 Impressão da OS	Baixo; o relatório da OS de serviço (RF-SRV-013) passa a ter gerador próprio de PDF, o que aumenta um pouco o esforço do SRV
2	RF-PRE-010 Biblioteca de planos padrão	Baixo; onboarding mais lento
3	RF-SRV-020 Relatório de serviços por cliente	Baixo; o relatório de cada OS (RF-SRV-013) continua; a prestação de contas do período sai da exportação da lista de OS
4	RF-MED-006 Medidor derivado	Implemento sem km automático
5	RF-MED-008 Leitura em lote	Leituras uma a uma

Ordem de corte	Requisito	Impacto de adiar
6	RF-TER-002 Catálogo de serviços do fornecedor	O planejador do cliente escolhe o prestador sem busca por classe e marca; o custo previsto da OS de terceiro é digitado. O catálogo próprio da subcontratada (RF-SRV-006) fica
7	RF-CON-016 Dossiê de fiscalização	Relatórios avulsos continuam disponíveis
8	RF-SRV-017 OS aberta pela subcontratada nasce no cliente	A subcontratada registra a falha encontrada na observação da OS e no relatório; o cliente abre a OS por conta própria
9	RF-TER-005 Link de execução de uso único	Prestador ocasional não registra a execução; um usuário interno lança por ele, ou o prestador recebe login e passa a contar como técnico
10	RF-SRV-019, só suspensão e reativação	A conexão só pode ser encerrada, não suspensa; o encerramento nunca sai do MVP
11	RF-SOL-004 Portal de solicitação por QR	Solicitante precisa de login
12	RF-SOL-005 Prazos de atendimento	MTTA calculado, sem alerta de prazo
13	RF-INT-002 Webhooks	Integrações por consulta periódica à API
14	RF-ATV-004 Composição de veículos	Afeta transportadoras; cortar só se o piloto não tiver carretas

Nunca saem do MVP: isolamento entre empresas (RNF-013), auditoria (RF-ADM-011), offline (RF-MOB-002 e RF-MOB-003), códigos de falha com catálogo padrão (RF-OS-011), assinatura avançada (RF-CON-014), NR-12 (RF-CON-001 a RF-CON-004), documentos com alertas (RF-CON-005 e RF-CON-006), "como calculamos" (RF-IND-002), o controle de versão (RNF-039 e RNF-040) e o núcleo do SRV que funciona sem cliente na Tenaz (RF-SRV-001 a RF-SRV-013), que sustenta o plano Serviços. São os diferenciais do sumário (seção 1.2), condição de operação ou linha de receita. Dois portões de isolamento valem como regra: o perfil `prestador` (RF-TER-004) só é liberado com o teste de RNF-037 verde (sem ele, as OS de terceiro são registradas por usuário interno), e a conexão entre contas (RF-SRV-014 a RF-SRV-019) só é liberada com o teste de três contas de RNF-041 verde e o atraso de RNF-042 medido (sem eles, a conexão vai para o mês 7 e o SRV é lançado sem conexão, com aval do dono do produto).

---

3. Critério de pronto

3.1 Para cada requisito

Um requisito só conta como entregue quando:

1. Validações e regras descritas no requisito têm testes automatizados.
2. Toda tabela nova tem RLS forçado e entra no teste de vazamento entre empresas que roda a cada build (RNF-013). Tabela lida pelos perfis `prestador` ou `locatario` entra também nos testes de RNF-037 ou RNF-

038. Tabela ou campo lido ou gravado pelo processo de sincronização entre contas entra no teste de três contas de RNF-041, e todo campo novo de OS ou de ativo é classificado como "compartilhável" ou "nunca compartilhado" na lista fechada da conexão (RF-SRV-014).

3. Endpoints estão na especificação OpenAPI e são os mesmos usados pela web e pelo app.
4. Alterações relevantes geram eventos de auditoria (RF-ADM-011).
5. Se o requisito prevê uso offline, há teste de cenário com desconexão, ação, reconexão e conflito.
6. As telas novas passam por verificação automática e manual de acessibilidade (RNF-025) e não escondem o selo de versão (RNF-039).
7. O p95 fica dentro de RNF-007 em homologação com massa de 2.000 ativos.
8. Há ajuda contextual mínima na tela.
9. O gerente de produto aceitou em homologação. Requisitos de CON também passam pelo consultor de SST; requisitos com NF-e de remessa, conserto ou locação passam pelo contador (P8).

3.2 Para cada marco

Marco	Quando	Critério de pronto
M0 Fundação	Fim de S0 (semana 2)	CI/CD verde; infraestrutura em São Paulo criada por código; teste de vazamento entre empresas rodando no CI; esteira de versionamento de RNF-039 ativa (versão gerada da tag, CHANGELOG verificado, release bloqueado em divergência, `GET /v1/versao` respondendo); build interno do app instalável
M1 Cadastros	Fim de S3 (semana 8)	Empresa de teste com 2.000 ativos importados por planilha em menos de 2 minutos; leituras validadas com regressão, teto de salto e troca de medidor; pessoas com e sem usuário cadastradas; conta de subcontratada de teste com clientes, equipamentos de clientes (`de_cliente`) e técnicos com especialidades
M2 Alpha interno	Fim de S6 (semana 14)	Ciclo completo solicitação → OS → execução offline → encerramento, com reconhecimento, `assumir` , desprogramação e liberação recusada; preventiva por tempo, medidor e "o que vencer primeiro" gerando OS `planejada` ; app operando 72 horas offline sem perda; OS de serviço aberta com serviço a realizar, distribuída, reatribuída e executada offline por técnico de subcontratada, com horas por técnico; teste de três contas de RNF-041 rodando no CI desde S4
M3 Piloto fechado	Fim de S8 (semana 18)	Pelo menos 3 empresas piloto com dados reais; OS de máquina NR-12 com os sete campos e assinatura avançada; documentos com alertas D-60, D-30 e D-7 funcionando; reserva e baixa de peças em OS; pelo menos uma subcontratada piloto com conta própria registrando OS de serviço com componentes substituídos; convite, aceite e ativos sincronizados entre duas contas em homologação
M4 MVP completo	Fim de S10 (semana 22)	Os 126 requisitos do MVP entregues; OS executada por usuário `prestador` e por link de uso único; teste de isolamento do prestador (RNF-037) no CI sem vazamento; relatório da OS em PDF com assinatura do cliente; ciclo completo entre contas (OS do cliente chega à subcontratada, execução offline, andamento de volta, liberação e recusa no cliente; OS aberta pela subcontratada nasce no cliente; encerramento da conexão sem perda de histórico); **portão da conexão:** teste de três contas de RNF-041 verde e atraso p95 < 60 s de RNF-042 medido em homologação; documentação pública da API; nenhum defeito crítico aberto

Marco	Quando	Critério de pronto
M5 Lançamento	Fim de S12 (semana 26)	Metas de RNF verificadas (carga, 7 dias offline, restauração de backup testada, atraso da sincronização entre contas sob carga); pentest sem achado crítico ou alto aberto, incluindo acesso do prestador, link de uso único e conexão entre contas; kit LGPD publicado, com o termo da conexão entre contas; página de status no ar; RPO e RTO publicados, com o RTO de região só depois da decisão de **P7**; preços publicados após P4; marca liberada (P5); release de produção `v1.0.0` conforme a seção 3.3
M6 Fase 2 completa	Fim do mês 12	Os 62 requisitos da Fase 2 entregues; testes de isolamento do locatário (RNF-038) e do almoxarifado em terceiro (RNF-037) no CI; pentest externo completo, incluindo portal do locatário; controles SOC 2 em operação e janela de observação iniciada
M7 SOC 2 Type II	Mês 19	Relatório Type II emitido pelo auditor
M8 Fase 3 completa	Fim do mês 24	Os 16 requisitos da Fase 3 entregues; preparação ISO 27001 iniciada

3.3 Para cada release em produção

Vale para o lançamento (M5) e para toda entrega posterior em produção, conforme **RNF-039** e **RNF-040**:

1. O release tem tag git `vX.Y.Z`, com incremento conforme SemVer 2.0.0: MAJOR para quebra de compatibilidade da API pública, MINOR para funcionalidade nova, PATCH para correção.
2. O `CHANGELOG.md`, no formato Keep a Changelog, tem a seção da versão com **todas** as implementações (com ID do requisito) e correções (com número do chamado) incluídas no release, e as notas aparecem em "Novidades desta versão".
3. Web, app, API e workers do release têm a mesma versão, gerada pelo build a partir da tag, nunca digitada; o CI bloqueia o release se tag, CHANGELOG e versão embutida divergirem.
4. A versão aparece no canto inferior direito da tela principal e da tela de login da web e do app, e "Sobre" mostra versão da web ou do app, versão da API, data do build, commit curto e ambiente.
5. `GET /v1/versao` devolve a versão, o commit e a data do build do release publicado.
6. Versões de pré-lançamento (`-rc.N`) só existem fora da produção.

---

4. MVP — meses 0 a 6

Treze sprints de 2 semanas (S0 a S12). Web e app avançam em paralelo; a coluna "App" mostra o que o time mobile entrega na mesma sprint. O terceiro backend conduz, a partir de S7, a trilha de terceiros (TER) e a assinatura avançada e, em S10, reforça a conexão entre contas. A **trilha SRV** (quarto backend e terceiro frontend, com o líder técnico no desenho da conexão) corre em paralelo desde S1, na coluna própria.

Sprint	Semanas	Tema	Requisitos entregues (web e servidor)	Trilha SRV (web e servidor)	App (MOB)	Depende de
S0	1–2	Fundação técnica	Base de RNF-013, RNF-016, RNF-020 e RNF-032; **esteira de versionamento de RNF-039 e RNF-040** (versão gerada da tag `vX.Y.Z`, `CHANGELOG.md` Keep a Changelog, CI rejeita pull request sem entrada no CHANGELOG, bloqueio de release no CI, `GET /v1/versao`) (sem RF de negócio)	Esquema `plataforma`, separado do RLS por empresa, previsto na infraestrutura como código; rascunho do ADR-009 (líder técnico)	Projeto Expo, SQLite, prova de conceito da fila de comandos (outbox), versão do app gerada pelo build	Time contratado
S1	3–4	Conta e acesso	RF-ADM-001 (sem o roteiro de primeiros passos), RF-ADM-002, RF-ADM-004, RF-ADM-005 (com `os.encerrar`, `est.decidir_destino` e escopos `interno`, `prestador`, `locatario`, `link`), RF-ADM-006, RF-ADM-011, RF-ADM-015; **selo de versão e tela "Sobre" na web** (RNF-039), na tela de login e na tela principal	**Conta da subcontratada:** RF-SRV-001 parcial (empresa com o módulo SRV, perfis da conta, escolha de empresa no login)	RF-MOB-001, com selo de versão e "Sobre" no app (RNF-039)	S0; quarto backend e terceiro frontend contratados
S2	5–6	Ativos	RF-ATV-001, RF-ATV-002, RF-ATV-003, RF-ATV-005, RF-ATV-006, RF-ATV-007, RF-ATV-008; RF-INT-003 para localizações e ativos	**Clientes:** RF-SRV-004 (clientes atendidos); RF-SRV-002 (especialidades de técnico)	RF-MOB-002 (cache de ativos), RF-MOB-004	S1
S3	7–8	Medidores e composição	RF-MED-001 a RF-MED-008, RF-ATV-004, RF-ATV-009, RF-ATV-011; RF-ATV-010 parcial	**Equipamentos e técnicos:** RF-SRV-005 (equipamentos de clientes, `de_cliente`); RF-SRV-003 parcial (técnicos com especialidades e capacitações; documentos em S9)	RF-MOB-003 parcial (leitura offline); cache de equipamentos de clientes	S2 (ativos)

Sprint	Semanas	Tema	Requisitos entregues (web e servidor)	Trilha SRV (web e servidor)	App (MOB)	Depende de
S4	9–10	Solicitações e núcleo da OS	RF-SOL-001 a RF-SOL-005, RF-OS-001 a RF-OS-005, RF-OS-016, RF-OS-017, RF-ADM-012	**Fundação da conexão** (sem RF): ADR-009 fechado; `conexao_empresa` no esquema da plataforma; papel de banco do processo de sincronização; outbox nos dois lados; idempotência; teste de três contas rodando no CI (base de RNF-041 e RNF-042)	RF-MOB-006; solicitação offline (RF-MOB-003); primeira versão nas lojas em teste fechado	S3
S5	11–12	Execução da OS	RF-OS-006, RF-OS-007 (com a ação `assumir`), RF-OS-008, RF-OS-009, RF-OS-011, RF-OS-015, RF-OS-018	**OS de serviço:** RF-SRV-006 (catálogo próprio, entidade `servico_fornecedor` que RF-TER-002 reaproveita em S7); RF-SRV-007 (abertura com equipamento, técnico e serviço a realizar)	Execução de OS offline (RF-MOB-003), RF-MOB-005; OS de serviço com serviço a realizar no app	S4
S6	13–14	Preventiva	RF-PRE-001 a RF-PRE-006, RF-PRE-008, RF-PRE-009, RF-PRE-010, RF-ADM-010	RF-SRV-009 (início, fim e apontamentos por técnico); RF-SRV-010 (distribuição e reatribuição); RF-TER-001 antecipado para a trilha SRV, porque o convite parte do fornecedor	OS preventiva no app; teste de 72 h offline; tarefas do técnico da subcontratada (RF-SRV-011 parcial)	S3 (medidores), S5
S7	15–16	Checklists, estoque básico e fornecedores	RF-CHK-001 a RF-CHK-006, RF-SOL-006, RF-EST-001 a RF-EST-004, RF-EST-006, RF-OS-010, RF-FRO-001, RF-TER-002	**Conexão:** RF-SRV-014 (convite, aceite e campos compartilhados)	Checklist offline, RF-MOB-007	S5, S6; RF-TER-001 (S6)
S8	17–18	NR-12, documentos e assinatura	RF-CON-001 a RF-CON-006, RF-CON-014, RF-CON-016, RF-OS-013, RF-OS-014	**Componentes:** RF-SRV-008 (substituído, consumido, fornecido pelo cliente, com números de série); **conexão:** RF-SRV-015 (ativos cobertos)	Campos NR-12 e assinatura avançada no app; componentes offline	S7 (RF-OS-010, RF-SRV-014); **parecer P1**

Sprint	Semanas	Tema	Requisitos entregues (web e servidor)	Trilha SRV (web e servidor)	App (MOB)	Depende de
S9	19–20	Indicadores e terceiros	RF-IND-001 a RF-IND-005, RF-IND-007; RF-ATV-010 completo; RF-TER-003, RF-TER-004, RF-TER-005; teste de isolamento do prestador no CI (RNF-037)	**Relatório PDF:** RF-SRV-012 (assinatura do cliente), RF-SRV-013 (relatório da OS em PDF); RF-SRV-003 completo (documentos dos técnicos); **conexão:** RF-SRV-016 (OS do cliente chega à subcontratada)	RF-MOB-010; perfil `prestador` no app, com cache filtrado por fornecedor; assinatura do cliente offline; OS recebida de cliente conectado	S8 (custos, marcos de tempo, assinatura, documentos); RF-OS-007 (atribuição a fornecedor)
S10	21–22	API, SSO e cobrança	RF-INT-001, RF-INT-002, RF-INT-003 completo, RF-ADM-007, RF-ADM-009 (com prestador cobrado como técnico e plano Serviços), RF-ADM-013	**Conexão:** RF-SRV-017 (OS aberta pela subcontratada nasce no cliente), RF-SRV-018 (andamento e liberação pelo cliente), RF-SRV-019 (suspensão e encerramento); RF-SRV-020 (relatório por cliente), RF-SRV-021 (indicadores); RF-SRV-001 com cobrança do plano Serviços; **portão da conexão** (RNF-041 verde, RNF-042 medido)	SSO no app; RF-SRV-011 completo (abrir OS em equipamento de cliente conectado, liberação recusada)	S9
S11	23–24	Endurecimento	Sem RF novo: testes de carga (RNF-007 a RNF-009, RNF-030), teste de 7 dias offline (RNF-010), restauração de backup (RNF-005), acessibilidade (RNF-025), pentest focado em isolamento entre empresas, acesso do prestador, link de uso único e conexão entre contas (proposta), primeiro release candidato `-rc` em homologação (RNF-039), correções do piloto	Carga da sincronização entre contas (RNF-042 sob carga), reconciliação diária, correções do piloto de subcontratada	Correções do piloto, teste em aparelhos de entrada (RNF-027), selo de versão na área segura dos aparelhos	S10

Sprint	Semanas	Tema	Requisitos entregues (web e servidor)	Trilha SRV (web e servidor)	App (MOB)	Depende de
S12	25–26	Lançamento	RF-ADM-001 completo (roteiro de primeiros passos), página de status (RNF-020), documentação pública da API, release `v1.0.0` (seção 3.3), migração dos pilotos para produção	RF-SRV-001 completo (roteiro de primeiros passos da conta Serviços)	Publicação nas lojas	S11; P4, P5 e P7 resolvidas

Verificação de cobertura: as 13 sprints entregam os 126 requisitos do MVP (105 da versão 0.2 e 21 do SRV). RF-ADM-001, RF-ATV-010, RF-INT-003, RF-MOB-003, RF-SRV-001, RF-SRV-003 e RF-SRV-011 são entregues em partes e contam como prontos na última sprint em que aparecem. RF-TER-001 passa de S7 para S6, na trilha SRV, sem mudar a contagem.

Onde entra cada parte do SRV:

Parte do SRV	Sprint	Requisitos
Conta da subcontratada e plano Serviços	S1 (conta), S10 (cobrança), S12 (roteiro)	RF-SRV-001
Técnicos e clientes	S2 (clientes, especialidades), S3 (técnicos e equipamentos de clientes), S9 (documentos dos técnicos)	RF-SRV-002 a RF-SRV-005
OS de serviço e componentes	S5 (catálogo e abertura), S6 (horas, distribuição e app), S8 (componentes)	RF-SRV-006 a RF-SRV-011
Relatório PDF	S9 (assinatura do cliente e relatório da OS), S10 (relatório por cliente e indicadores)	RF-SRV-012, RF-SRV-013, RF-SRV-020, RF-SRV-021
Conexão entre contas	S4 (fundação e teste de três contas), S7 (convite), S8 (ativos), S9 (OS do cliente), S10 (OS da subcontratada, andamento, liberação, encerramento; portão)	RF-SRV-014 a RF-SRV-019, RNF-041, RNF-042

4.1 Por que esta ordem

- **Versionamento e selo de versão desde o início:** a esteira de RNF-039 fica pronta em S0, junto com o CI, e o selo de versão entra na primeira entrega de interface (S1). Assim, todo build de homologação e de piloto já é identificável.
- **Pessoas junto com usuários (S1):** CNH, capacitações e documentos pessoais ligam-se à `pessoa`; criar a entidade depois exigiria migrar usuários e motoristas.
- **Ativos e medidores antes da OS:** a OS, a preventiva por medidor e os KPIs dependem do ativo, da hierarquia e de leituras confiáveis.
- **Offline desde o início:** a sincronização é o maior risco técnico. O app começa em S0 e cada sprint acrescenta operações offline, em vez de deixar o offline para o fim.
- **Preventiva no meio do MVP:** é o primeiro valor percebido pelo cliente e precisa de OS e medidores prontos.

- **Fornecedores em S7, junto com o estoque:** o cadastro com papéis (RF-TER-001) serve ao estoque e à atribuição de OS; o catálogo (RF-TER-002) é cadastro simples.
- **NR-12 e assinatura em S8:** dependem da OS completa e do parecer P1 sobre assinatura, que tem até a semana 14 para chegar.
- **Prestador em S9:** o acesso do prestador reutiliza a execução de OS (S5), a assinatura (S8) e o modelo de permissões (S1); o filtro por fornecedor só é liberado com o teste de isolamento verde (risco R4).
- **KPIs depois dos dados:** só fazem sentido com marcos de tempo, tipos, custos e falhas já gravados.
- **API em S10:** a API pública expõe o domínio estável. A web e o app usam os mesmos endpoints desde S1, então S10 trata de chaves, escopos, limites, webhooks e documentação.
- **Trilha SRV em paralelo desde S1:** o SRV reaproveita quase tudo do núcleo, mas não pode esperar o núcleo terminar. A trilha anda uma sprint atrás do que reaproveita: equipamentos de clientes em S3, depois do ativo (S2); OS de serviço em S5, depois do núcleo da OS (S4); horas e distribuição em S6, depois do apontamento e da atribuição (S5); componentes em S8, depois da baixa de peças (S7); assinatura do cliente e relatório em S9, depois da assinatura avançada (S8).
- **Fundação da conexão cedo (S4):** a conexão é o maior risco novo (R5, crítico). O teste de três contas entra no CI em S4, vazio, e cresce a cada sprint, como o teste de vazamento entre empresas desde S0. Assim o isolamento é verificado antes de existir fluxo de OS entre contas.
- **Fornecedor em S6, na trilha SRV:** o convite de conexão parte do `fornecedor` do cliente (RF-SRV-014, S7), por isso RF-TER-001 sai de S7 e é feito pela trilha SRV em S6; RF-TER-002 continua em S7 e usa a entidade `servico_fornecedor` criada para o catálogo próprio da subcontratada em S5.
- **Fluxos de OS entre contas em S9 e S10:** dependem da atribuição a fornecedor (RF-OS-007, S5), da conclusão e liberação completas (RF-OS-014, S8) e dos ativos já sincronizados (S8). O terceiro backend, livre do TER em S10, reforça a conexão. Os itens do SRV que estão na linha de corte (RF-SRV-017, RF-SRV-019 parcial, RF-SRV-020) ficam em S10, a última sprint com RF novo, para que o corte não desmonte o que veio antes.

---

5. Fase 2 — meses 7 a 12

Quatro trilhas em paralelo (proposta): **A** frota e conformidade, **B** estoque (completo e estendido), **C** integrações, identidade e IA, **D** terceiros, locação e SRV. A trilha D ocupa o quarto backend e o terceiro frontend, que vêm da trilha SRV do MVP e acumulam a evolução do SRV pedida pelos pilotos de subcontratadas. A Fase 2 não acrescenta requisitos ao SRV; os ganchos com a Fase 2 são: o contrato de prestação (RF-TER-006, mês 8) passa a definir os ativos cobertos da conexão (RF-SRV-015); as capacitações (RF-CON-012, mês 7) reaproveitam a entidade `capacitacao` já entregue para os técnicos do SRV e o bloqueio de atribuição (RF-CON-013) passa a valer também na conta da subcontratada; o desempenho do fornecedor (RF-TER-007, mês 9) usa os marcos que chegam pela conexão.

Mês	Trilha A — frota e conformidade	Trilha B — estoque	Trilha C — integrações, identidade e IA	Trilha D — terceiros, locação e SRV	Depende de
7	RF-PRE-007 (planos aninhados), RF-OS-012 (catálogo de falhas)	RF-EST-005 (inventário), RF-EST-007 (requisição), RF-EST-008 (compras), RF-EST-012 (vários almoxarifados e transferência)	RF-ADM-003 (multi-unidade), RF-IND-009, RF-CON-012, RF-CON-013 (capacitações e bloqueio)	RF-TER-009 (orçamento de fornecedor), RF-TER-008 (oficina externa e assistência técnica)	MVP; feedback do lançamento
8	RF-FRO-002 a RF-FRO-006 (pneus, CPK), RF-MOB-009	RF-EST-009 (NF-e e NFS-e), RF-EST-011, RF-MOB-008	RF-IA-001; infraestrutura de busca vetorial isolada por empresa	RF-TER-006 (contratos de prestação com SLA, que passam a definir os ativos cobertos da conexão, RF-SRV-015), RF-OS-020 (garantia)	RF-EST-008 para NF-e; contador para CBS e IBS
9	RF-FRO-007, RF-FRO-008, RF-FRO-009 (combustível), RF-INT-007, RF-FRO-010 (multas), RF-FRO-011 (sinistros), RF-IND-006	RF-EST-013, RF-EST-014 (almoxarifado em terceiro, saldo geral e por subcontratada), RF-EST-015 (remessa e retorno), RF-EST-019 (NF-e de remessa e retorno)	RF-IA-002, RF-IA-003	RF-TER-007 (avaliação), RF-LOC-001 (locatários), RF-LOC-002 (contrato de locação)	**P8** para RF-EST-015 e RF-EST-019; RF-TER-004 (MVP)
10	RF-CON-008, RF-CON-009, RF-CON-010 (NR-13)	RF-EST-016 (peças serializadas), RF-EST-017 (reparáveis e quarentena)	RF-IA-004, RF-INT-004 (modelo canônico de telemática), RF-ADM-008 (SAML e SCIM)	RF-LOC-003 (itens), RF-LOC-004 (matriz de responsabilidade), RF-LOC-005 (vistorias, também no app offline), RF-LOC-006 (avaria gera OS)	**P6** para RF-CON-009; consultor de SST; RF-CHK-001 para vistorias
11	RF-CON-011 (LOTO), RF-CON-007 (aptidão e bloqueio de despacho)	RF-EST-018 (ordem de reparo)	RF-INT-005 (Cobli, Geotab, rFMS), RF-INT-006 (DTC), RF-INT-008 (ERP: Sankhya, Protheus, Omie), RF-IND-008	RF-LOC-007 (ativo tomado e SLA de substituição), RF-LOC-008 (portal do locatário), RF-LOC-009 (relatório de cobrança)	RF-INT-004; RF-TER-009 e RF-EST-017 para a ordem de reparo; acesso a ambientes de teste dos ERPs e telemáticas
12	Endurecimento e piloto de frota e NR-13	Endurecimento e piloto de estoque em terceiro	Pentest externo completo; início da janela de observação SOC 2	Endurecimento, teste de isolamento do locatário (RNF-038) e piloto de locação	Todos os anteriores

Verificação de cobertura: os seis blocos entregam os 62 requisitos da Fase 2 (trilha A: 20; B: 14; C: 14; D: 14).

5.1 Entregas e critério de pronto por mês

Mês	Entrega verificável
7	OS enviada a oficina externa com orçamento aprovado por alçada e nota lançada; empresa com duas unidades e usuário restrito a uma delas, testado também pela API; transferência entre dois almoxarifados com recebimento confirmado; técnico sem capacitação válida bloqueado na atribuição
8	Veículo com mapa de pneus, rodízio no app offline e CPK calculado por pneu; NF-e real importada com itens casados e custo médio atualizado; contrato de prestação com SLA estourado gerando `fornecedor.sla_violado`; contrato de prestação com fornecedor conectado definindo os ativos sincronizados na conta da subcontratada
9	Abastecimentos importados de cartão com alertas de anomalia; multa com prazo de 30 dias e condutor identificado pelo vínculo; remessa a subcontratada com NF-e registrada, consumo pelo `prestador` em OS e retorno das sobras, com saldo geral e por subcontratada conferidos; contrato de locação cedido ativado
10	Prazos NR-13 calculados para caldeira e vaso, com a tabela conferida no DOU; peça serializada instalada e removida pela OS, indo para a quarentena; vistoria de devolução offline com avaria gerando OS com custo do locatário
11	OS com LOTO que não inicia sem bloqueios verificados; aptidão do veículo consultável pela API; ordem de reparo completa (envio, orçamento, aprovação, retorno como recondicionada com garantia); leituras e DTCs de pelo menos um conector de telemática chegando a uma empresa piloto; sincronização com pelo menos um ERP; login SAML e SCIM testados; locatário abrindo solicitação pelo portal e relatório de cobrança de avarias e horas excedentes gerado
12	Pentest externo sem achado crítico ou alto aberto, incluindo a conexão entre contas; testes de isolamento do prestador, do locatário e das contas conectadas (RNF-041) verdes; controles SOC 2 documentados e em operação; métricas dos pilotos de frota, NR-13, estoque em terceiro, locação e subcontratadas com conta própria revisadas

6. Fase 3 — meses 13 a 24

Mês	Entrega	Requisitos	Depende de
13	Programação por capacidade, primeira parte (calendário de técnicos, carga semanal)	RF-OS-019 (início)	RF-OS-007
14	Programação congelada, schedule compliance e wrench time	RF-OS-019, RF-IND-011	Mês 13
15	Ingestão de IoT por MQTT e HTTP, séries temporais, gateway de parceiro para OPC UA e Sparkplug B	RF-INT-010	Parceiro de gateway definido
16	Manutenção baseada em condição; confiabilidade com Weibull	RF-PRE-011, RF-IND-010	RF-INT-010; histórico de falhas da Fase 2
17	Agentes de IA com aprovação; assistente de análise de falha	RF-IA-006, RF-IA-005	RF-IA-001 a RF-IA-004
18	Relatórios em linguagem natural; servidor MCP somente leitura	RF-IA-007, RF-INT-011	RF-INT-001
19	TCO e renovação; conector de BI; **relatório SOC 2 Type II**	RF-IND-012, RF-INT-012	Custos de frota da Fase 2; janela SOC 2 de 6 meses

Mês	Entrega	Requisitos	Depende de
20	RCM e FMEA com Action Priority	RF-PRE-012	RF-OS-012; leitura de SAE JA1011 e AIAG-VDA
21	Gestão de ativos ISO 55001	RF-ATV-012	RF-PRE-012
22	Assinatura ICP-Brasil; importação automática de multas	RF-CON-015, RF-INT-009	**P1** e **P3**
23	Banco dedicado opcional	RF-ADM-014	Primeiro cliente Enterprise que exija
24	Consolidação, pentest anual, preparação ISO 27001	Sem RF novo	—

Verificação de cobertura: os doze blocos entregam os 16 requisitos da Fase 3. Na Fase 3, o quarto backend e o terceiro frontend permanecem e absorvem a evolução de TER, SRV, EST e LOC pedida pelos clientes (proposta).

Contingências: - Se o **portão da conexão** (RNF-041 verde e RNF-042 medido) não passar em M4, RF-SRV-014 a RF-SRV-019 saem do lançamento e entram no mês 7, na trilha D, com aval do dono do produto (o sumário 4 põe a conexão no MVP). O restante da trilha D desliza um mês e a válvula é a do risco 19: RF-LOC-007 e RF-LOC-009 passam para o início da Fase 3. - Se o parecer **P1** exigir ICP-Brasil para documentos de SST, o MVP sai com a assinatura avançada (RF-CON-014) e aviso ao cliente sobre a pendência (proposta); RF-CON-015 sobe para o mês 9 da Fase 2, na trilha C, e RF-IA-003 desce para o mês 12. - Se **P3** confirmar que não há API acessível, RF-INT-009 sai do roadmap e as multas continuam por digitação e planilha. - Se **P8** não estiver resolvida até o mês 9, RF-EST-015 e RF-EST-019 entram com CFOP informativo e nota obrigatória por parâmetro, como prevê RF-EST-019, e a validação fiscal vira correção no mês 12. - CDC para ClickHouse só entra se o volume de leituras e telemetria justificar, como recomenda o estudo; não há bloco reservado.

7. Atividades não técnicas

Atividade	Início	Prazo	Responsável	Resultado esperado	Requisitos afetados
P1 Parecer jurídico sobre o item 1.6 da NR-1 (ICP-Brasil em documentos de SST)	S0	Semana 14 (fim de S6)	Gerente de produto e advogado	Forma de assinatura aceita para OS de NR-12 e registros de NR-13	RF-OS-014, RF-CON-002, RF-CON-010, RF-CON-014, RF-CON-015
P2 Leitura dos anexos das Portarias Inmetro 127 e 128/2022 (CIV e CIPP)	S0	Semana 6	Gerente de produto e consultor de SST	Confirmar ou descartar o cálculo sugerido de validade	RF-CON-005
P3 Consulta ao Serpro sobre API Senatran (e-Frotas)	S0	Mês 6	Gerente de produto	Decidir RF-INT-009	RF-FRO-010, RF-INT-009

Atividade	Início	Prazo	Responsável	Resultado esperado	Requisitos afetados
P4 10 a 15 entrevistas com gestores de manutenção e frota, mais 5 a 8 com subcontratadas e assistências técnicas (proposta)	S1	Semana 10; síntese na semana 12	Gerente de produto e designer	Preços e mínimos validados antes da página de preços (S10), inclusive o plano Serviços e o desconto de canal; prioridades da Fase 2; interesse em TER, SRV e LOC; recrutamento de pilotos	RF-ADM-009, RF-SRV-001, planos marcados " (proposta)"
P5 Busca no INPI (classes 9 e 42), depósito de marca e registro de domínio	S0, semana 1	Busca na semana 1; depósito até a semana 4	Gerente de produto e advogado	Nome liberado ou troca decidida antes de qualquer material do piloto (S8)	Todo material público
P6 Conferência no DOU dos prazos NR-13 com SPIE, categorias III a V	Mês 7	Mês 9	Consultor de SST	Tabela de prazos confirmada	RF-CON-009
P7 Decisão sobre o local da cópia de recuperação de desastre	S0	Semana 20 (fim de S9)	Dono do produto, com advogado e Plataforma/SRE	Uma das opções da seção 5.1 do documento 1 escolhida; contrato de tratamento de dados e RTO de região ajustados antes do lançamento	RNF-004, RNF-005, RNF-006
P8 Validação com o contador dos CFOPs e do tratamento fiscal de remessa e retorno a subcontratada, conserto e locação	Mês 7	Mês 8	Contador e gerente de produto	Lista de CFOPs e obrigatoriedade da NF-e por tipo de movimentação	RF-EST-015, RF-EST-018, RF-EST-019, RF-LOC-002, RF-LOC-009
Piloto fechado do MVP	Recrutamento em S2–S5	Uso em S8–S11	Gerente de produto	3 a 5 empresas, com pelo menos uma indústria com NR-12, uma transportadora e uma operação logística ou de varejo, e pelo menos uma que use subcontratada ou assistência técnica (proposta)	Todo o MVP

Atividade	Início	Prazo	Responsável	Resultado esperado	Requisitos afetados
Piloto de subcontratada com conta própria (SRV)	Recrutamento em S2–S5	Uso em S8–S11	Gerente de produto	1 a 2 subcontratadas ou assistências técnicas com conta própria; pelo menos uma conectada a uma das empresas piloto, para exercitar a conexão entre contas em S10 e S11 (proposta)	RF-SRV-001 a RF-SRV-021, RNF-041, RNF-042
Termo da conexão entre contas (LGPD)	S4	S7 (antes do primeiro convite)	Advogado e gerente de produto	Papéis de cada conta no compartilhamento (controlador e operador), base legal, aceite no convite e na aceitação, cláusula no DPA	RF-SRV-014, RNF-021
Piloto de frota (Fase 2)	Mês 8	Mês 12	Gerente de produto	Transportadora usando pneus, combustível e multas	RF-FRO-002 a RF-FRO-011
Piloto NR-13 (Fase 2)	Mês 10	Mês 12	Gerente de produto e consultor de SST	Indústria com caldeira ou vasos usando prazos e Registro de Segurança	RF-CON-008 a RF-CON-010
Piloto de estoque em terceiro (Fase 2)	Mês 9	Mês 12	Gerente de produto	Empresa com subcontratada mantendo estoque e com peças reparáveis enviadas para conserto	RF-EST-013 a RF-EST-019
Piloto de locação (Fase 2)	Mês 9	Mês 12	Gerente de produto	Locadora de equipamentos ou empresa com ativos tomados em locação usando contratos, vistorias e portal do locatário	RF-LOC-001 a RF-LOC-009
Kit LGPD (DPA, RIPD modelo, política de privacidade, termos de uso, encarregado)	S8	S11	Advogado e gerente de produto	Publicado no lançamento	RNF-021

Atividade	Início	Prazo	Responsável	Resultado esperado	Requisitos afetados
Pentest	Focado em isolamento, autenticação, acesso do prestador, link de uso único e conexão entre contas em S11 (proposta); completo no mês 12, incluindo portal do locatário; depois anual	—	Plataforma/SRE e empresa contratada	Sumário de pentest disponível a clientes	RNF-018, RNF-037, RNF-038, RNF-041
SOC 2	Avaliação de lacunas no mês 7; controles e ferramenta de conformidade nos meses 8 a 11	Janela de observação dos meses 12 a 18; relatório Type II no mês 19 (proposta)	Plataforma/SRE e auditor	Controles e janela iniciados na Fase 2 e relatório Type II na Fase 3, conforme o sumário	RNF-036
ISO 27001	Mês 21	Depois do mês 24	Plataforma/SRE	Preparação iniciada	RNF-036
Validação fiscal da importação de NF-e (CBS e IBS)	Mês 7	Mês 8	Contador	Leiaute aceito pelo leitor de XML	RF-EST-009
Página de preços, documentação da API, base de conhecimento	S10	S12	Gerente de produto e designer	Publicadas no lançamento	RF-ADM-009, RF-INT-001

8. Dependências críticas

1. **Medidores → preventiva por medidor → KPIs de frota.** Sem RF-MED-003 confiável, a preventiva por km gera OS errada e o custo por km fica sem sentido.
2. **OS completa → NR-12.** RF-CON-002 é uma validação na conclusão da OS (RF-OS-014); não pode vir antes.
3. **P1 → assinatura de OS de NR-12 e de registros de NR-13.** A assinatura avançada (RF-CON-014) entra em S8 com arquitetura plugável, para trocar o método sem migrar dados.
4. **Compras → NF-e → custo de oficina externa.** RF-EST-009 depende de RF-EST-008; RF-TER-008 usa RF-EST-009 para a nota e RF-TER-009 para o orçamento.
5. **Capacitações → bloqueio de atribuição → LOTO.** RF-CON-013 precisa de RF-CON-012; o LOTO usa as capacitações para saber quem pode bloquear.
6. **Modelo canônico de telemática → conectores → DTC.** RF-INT-005 e RF-INT-006 dependem de RF-INT-004.
7. **IA nível 1 → agentes.** RF-IA-006 depende da governança (RF-IA-001) e da busca (RF-IA-002).

8. **SOC 2 Type II → janela de observação.** O relatório não sai antes de alguns meses de controles operando; não é possível comprimir no fim.
9. **Pessoa → usuários, motoristas, capacitações.** RF-ADM-015 entra em S1, antes de qualquer cadastro que dependa da pessoa.
10. **Perfil prestador e isolamento → estoque em terceiro.** RF-EST-013 depende de RF-TER-004 e do teste de RNF-037 já em operação desde o MVP.
11. **Peças serializadas → reparáveis e quarentena → ordem de reparo.** RF-EST-018 depende de RF-EST-016, RF-EST-017 e do orçamento de fornecedor (RF-TER-009).
12. **P8 → remessa, retorno e conserto com NF-e.** RF-EST-015, RF-EST-018 e RF-EST-019 dependem da lista de CFOPs; a contingência da seção 6 evita bloqueio.
13. **Contrato de locação → itens e matriz → vistorias → avaria → cobrança.** RF-LOC-009 só faz sentido com RF-LOC-004 a RF-LOC-006 prontos; a vistoria reutiliza o motor de checklists (RF-CHK-001).
14. **Esteira de versionamento → todo release.** RNF-039 precisa estar ativo desde S0; um release sem tag, CHANGELOG e versão coerentes é bloqueado no CI.
15. **Ativo e OS → SRV.** O equipamento de cliente é um `ativo` (RF-ATV-002, S2) e a OS de serviço é uma `ordem_servico` (RF-OS-001 a RF-OS-009, S4 e S5); a trilha SRV anda uma sprint atrás do que reaproveita.
16. **Fundação da conexão → fornecedor e convite → ativos → OS entre contas → liberação.** O teste de três contas (S4) vem antes de qualquer fluxo; o convite (RF-SRV-014, S7) depende de RF-TER-001 (S6); a OS do cliente (RF-SRV-016, S9) depende dos ativos sincronizados (RF-SRV-015, S8) e da atribuição a fornecedor (RF-OS-007); a liberação de volta (RF-SRV-018, S10) depende de RF-OS-014 (S8).
17. **Assinatura avançada → assinatura do cliente e relatório.** RF-SRV-012 e RF-SRV-013 (S9) usam a assinatura e o gerador de PDF de RF-CON-014 e RF-OS-018.
18. **Termo da conexão (LGPD) → primeiro convite.** Sem o termo aprovado até S7, o convite fica restrito a homologação.
19. **Contrato de prestação (Fase 2) → ativos cobertos.** No MVP, a conexão usa a seleção manual de ativos; a partir do mês 8, o contrato vigente define a lista (RF-SRV-015).

---

9. Riscos do cronograma

#	Risco	Impacto	Probabilidade	Mitigação
1	Contratação atrasada ou time menor que o da seção 2, em especial o terceiro backend (S0), o quarto backend e o terceiro frontend antecipados para S1 por causa do SRV	Alto	Alta	Iniciar com o núcleo; aplicar a linha de corte da seção 2; mês 0 só conta com o núcleo contratado; sem os reforços do SRV, as alternativas da seção 2.1 (15 a 16 sprints, 14 sprints com só o quarto backend, ou conexão no mês 7 com aval do dono do produto)
2	Escopo do MVP (126 requisitos) grande para 6 meses	Alto	Média	Quarto backend e terceiro frontend desde S1; trilha SRV paralela; linha de corte pré-definida, com os itens do SRV concentrados em S10; revisão de escopo no fim de S6 com os dados de velocidade das primeiras sprints

#	Risco	Impacto	Probabilidade	Mitigação
3	Sincronização offline mais difícil que o previsto (conflitos, numeração provisória, fotos, cache filtrado do prestador e do técnico da subcontratada, comando offline sobre OS ligada a cliente conectado)	Alto	Média	Dois desenvolvedores mobile desde S0; prova de conceito em S0; teste de 72 h em S6 e de 7 dias em S11; escopo de cache fechado em RF-MOB-002; o comando offline é aplicado primeiro na conta da subcontratada e só depois sincronizado com o cliente (RF-SRV-011)
4	Parecer P1 atrasado ou exigindo ICP-Brasil	Alto	Média	Contratar em S0; assinatura avançada plugável; contingência da seção 6
5	Desempenho de RLS com volume real, somado aos filtros por fornecedor e por locatário e ao processo de sincronização entre contas	Médio	Média	Índices por empresa e por fornecedor desde S0; testes de carga a partir de S6 com 2.000 e 10.000 ativos; carga da sincronização entre contas em S11 com meta de RNF-042
6	Pilotos indisponíveis ou pouco engajados	Médio	Média	Recrutar 5 empresas para manter 3; gratuidade durante o piloto (proposta); contato semanal
7	Nome Tenaz indisponível no INPI (P5)	Médio	Baixa	Busca na semana 1; decisão de troca antes de S8
8	Preço não validado (P4) ou upgrade fraco para o Profissional no lançamento (R3 do sumário), já que pneus, NR-13, multi-unidade, estoque em terceiro e locação só chegam na Fase 2	Médio	Média	Entrevistas até a semana 10; preço de lançamento do Profissional com desconto até a Fase 2, ou lançar comercialmente o Profissional só na Fase 2, conforme o sumário
9	APIs de telemática e cartão combustível não verificadas (Ticket Log, Sascar, Omnilink)	Médio	Alta	Começar por Cobli, Geotab e rFMS; importação de arquivo como alternativa
10	Conectores de ERP exigem ambientes de teste e parcerias	Médio	Média	Iniciar contato com Sankhya, TOTVS e Omie no mês 8
11	Mudança regulatória (tabela NR-13, leiaute de NF-e com CBS e IBS)	Médio	Média	Tabelas parametrizáveis e versionadas; contador e consultor de SST no ciclo
12	Custo de modelos de IA acima do previsto	Médio	Média	Créditos por plano; limites por empresa; IA só na Fase 2
13	"Price match" da Tractian anula vantagem de preço (R1 do sumário)	Médio	Média	Priorizar diferenciais (frota unificada, offline, conformidade, terceiros e locação) nos pilotos e no material de venda
14	Dependência de poucas pessoas (líder técnico, mobile, backend da sincronização entre contas)	Médio	Média	Revisão em par; decisões registradas em 5_ARQUITETURA_SOFTWARE.md (inclusive o ADR-009); dois mobile desde o início; o terceiro backend acompanha a conexão desde S7 e assume parte dela em S10

#	Risco	Impacto	Probabilidade	Mitigação
15	Aprovação nas lojas de apps e atualizações do Expo	Baixo	Média	Teste fechado nas lojas desde S4; folga de uma semana antes do lançamento
16	**R4 do sumário:** prestador com acesso ao sistema vê dados de outra empresa contratante ou de outro prestador; o mesmo vale para o locatário	Crítico	Média	Filtro por fornecedor e por locatário no servidor, além do RLS; testes automatizados de RNF-037 (MVP, S9) e RNF-038 (Fase 2, mês 12) a cada build; perfil `prestador` só liberado com o teste verde; pentest focado em S11 e completo no mês 12
17	**P7** sem decisão até o lançamento	Alto	Média	Decisão até a semana 20; sem ela, o lançamento publica só o RTO de zona e mantém a cópia de recuperação dentro do que o contrato com o cliente permitir
18	**P8** sem resposta do contador antes do estoque em terceiro e da locação	Médio	Média	Contador contratado no mês 7; CFOP informativo e nota obrigatória por parâmetro como contingência (seção 6)
19	Escopo da Fase 2 (62 requisitos) grande para 6 meses, com mobile sobrecarregado por vistorias, peças serializadas e prestador movimentando estoque	Alto	Média	Quarta trilha com backend e frontend adicionais; vistoria reaproveita o motor de checklists; revisão de escopo no fim do mês 9; se preciso, RF-LOC-007 e RF-LOC-009 passam para o início da Fase 3
20	Esteira de versionamento bloqueando releases urgentes de correção	Baixo	Baixa	Release de PATCH com o mesmo fluxo automatizado (tag, CHANGELOG, build); nenhum atalho manual de versão (RNF-039)
21	**R5 do sumário:** a sincronização entre contas conectadas copia dado além do permitido ou para a conta errada	Crítico	Média	Fundação e teste de três contas no CI desde S4 (RNF-041); lista fechada de campos validada no envio e no recebimento; transações separadas por conta; papel de banco próprio sem `BYPASSRLS`; auditoria nos dois lados; conexão liberada só com o portão de M4; pentest focado em S11 e completo no mês 12; classificação de todo campo novo como compartilhável ou não (critério de pronto 3.1)
22	**R6 do sumário:** SRV no MVP aumenta o escopo do lançamento	Alto	Alta	Reaproveitar OS, apontamento, ativos, app e catálogo (seção 2.1); quarto backend e terceiro frontend antecipados para S1; trilha SRV paralela; itens do SRV na linha de corte concentrados em S10; portão da conexão com saída para o mês 7
23	Mobile e QA sobrecarregados pelo SRV (componentes, assinatura do cliente, OS ligada a cliente, cenários de sincronização entre contas)	Médio	Média	O terceiro frontend apoia as telas do app do técnico da subcontratada (proposta); o teste de três contas é escrito pelo backend da trilha SRV, com revisão do QA; QA focado na conexão em S10 e S11
24	Dúvida jurídica sobre os papéis de cada conta no compartilhamento de dados entre contas conectadas (LGPD)	Médio	Média	Termo da conexão aprovado até S7 (seção 7); sem ele, convites só em homologação; dados pessoais fora da lista fechada (CPF, documentos, saúde)

#	Risco	Impacto	Probabilidade	Mitigação
25	Conexão entre contas pouco usada no lançamento, porque depende de cliente e subcontratada estarem na Tenaz ao mesmo tempo	Médio	Média	Piloto com pelo menos uma subcontratada conectada a uma empresa piloto; o SRV tem valor sem conexão (relatório em PDF); desconto de canal (P4) como incentivo

---

Histórico de versões

- v0.1 (12/11/2026): primeira versão, em elaboração.
- v0.2 (12/11/2026): alinhada ao sumário executivo 0.3. TER básico no MVP; TER completo, EST estendido e LOC na Fase 2, com quarta trilha; MVP com 105 requisitos e Fase 2 com 62; time de 12 pessoas no MVP e 15 a partir da Fase 2; RNF-039 com esteira de versionamento em S0, selo de versão em S1 e critério de pronto de release (seção 3.3); riscos R4, P7 e P8; linha de corte revista.
- v0.3 (12/11/2026): alinhada ao sumário executivo 0.4. SRV completo no MVP, com trilha SRV paralela desde S1 e a tabela de onde entra cada parte; MVP com 126 requisitos funcionais e 42 não funcionais; estimativa do acréscimo do SRV (cerca de 16 sprints-pessoa, já descontado o reaproveitamento); quarto backend e terceiro frontend antecipados para S1 (MVP com 14 pessoas, Fase 2 com 15), prazo mantido em 13 sprints; RF-TER-001 antecipado para S6; portão da conexão em M4 (RNF-041 e RNF-042); linha de corte com itens do SRV; marcos, dependências, piloto de subcontratada, termo LGPD da conexão e riscos R5, R6 e 23 a 25.
